


Procedure Vrijgevingsbewijs

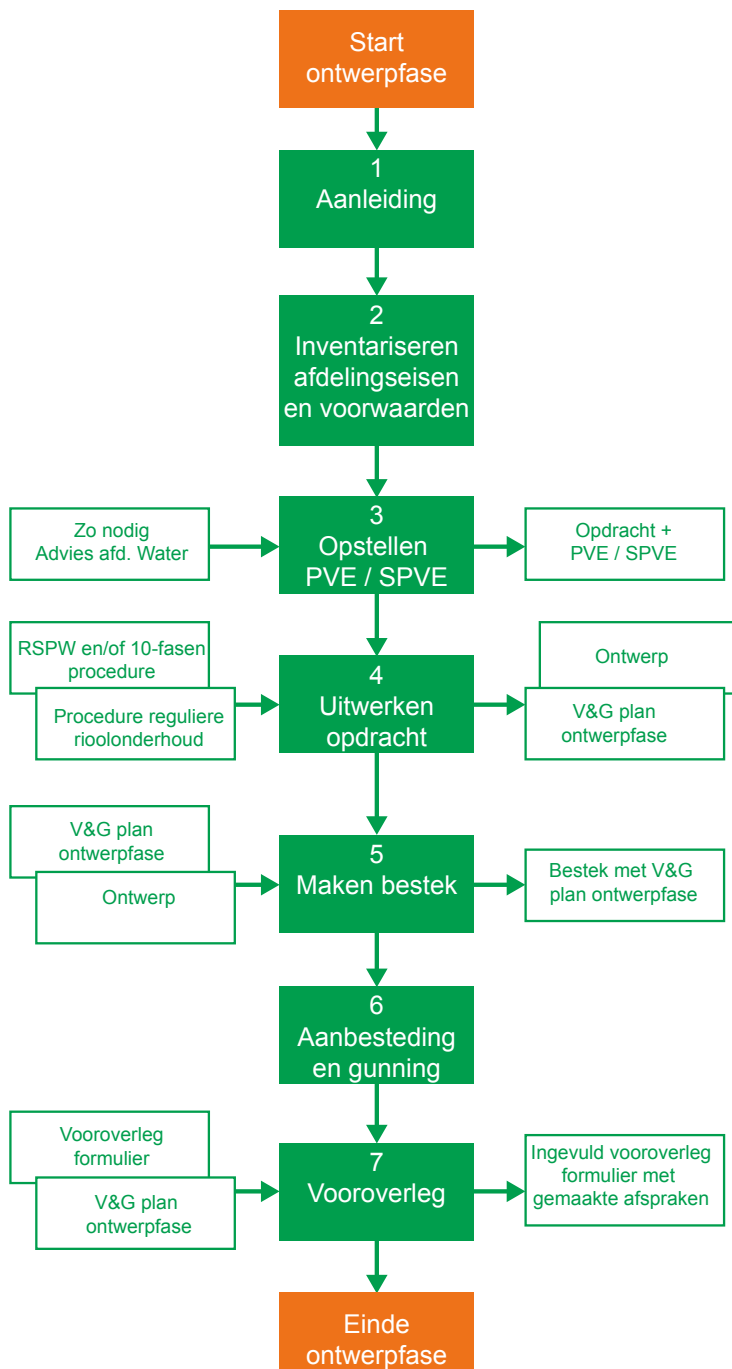

1. Start ontwerpfase. De aanleiding tot de voorgenomen werkzaamheden kan divers zijn. Zoals gepland onderhoud, renovatie of naar aanleiding van een storing of calamiteit.

2. Randvoorwaarden van de afdeling worden door de initiatiefnemer of opdrachtgever geïnventariseerd.


3. Na de inventarisatie en het (zo nodig) inwinnen van advies van afdeling Water wordt een Programma van Eisen (PvE) of een Specifiek Programma van Eisen (SPvE) door de opdrachtgever opgesteld. Dit wordt samen met de opdracht naar de ontwerpende partij, veelal het Ingenieursbureau Rotterdam (IGR), gestuurd. De opdracht kan uitgeschreven worden door de afdeling Water. Omdat op bijna alle soorten werkzaamheden in of aan riolen, persleidingen of gemalen het Bouwprocesbesluit van toepassing is, moet in de opdracht ook worden opgenomen dat de ontwerpende partij een Veiligheid en gezondheid (V&G)-coördinator ontwerpfase aantelt die onder andere een V&G plan opstelt.

4. Voor het uitwerken van de opdracht wordt, afhankelijk van het soort werk, de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken (RSPW) en/of de 10-fasen procedure (gemaal/persleiding) of het proces 'regulier Rioolonderhoud' gevolgd. De V&G-coördinator ontwerpfase stelt onder andere het V&G plan ontwerpfase op. Een V&G plan is een opsomming van te voren in te schatten, niet gebruikelijke, veiligheidsrisico's, eventueel voorzien van voorstellen ter voorkoming van die risico's.

5. Na akkoord van de opdrachtgever met het ontwerp en controle van het V&G-plan ontwerpfase, maakt de ontwerpende partij een bestek waarin ondermeer het V&G-plan ontwerpfase is opgenomen. Ook wordt in dit bestek opgenomen dat de uitvoerende partij een V&G-coördinator moet aanstellen.

6. Na goedkeuring van het bestek door de opdrachtgever, wordt door de ontwerpende partij de aanbesteding en gunning van het werk in samenwerking met de afdeling Aanbestedingszaken geregeld.

7. Als bekend is wie het werk gaat uitvoeren, wordt op initiatief van de ontwerpende partij een vooroverleg met Procesbeheer, de ontwerpende en de uitvoerende partij gehouden. Procesbeheer bepaalt op de procesvoering van de afdeling Water gedurende de werkzaamheden een normale procesvoering (NP) of een afwijkende procesvoering (AP) moet zijn. De afspraken worden op het vooroverlegformulier vastgelegd. De ontwerpende partij zorgt voor de verslaglegging. Het afronden van stap 7 is het einde van de ontwerpfase.

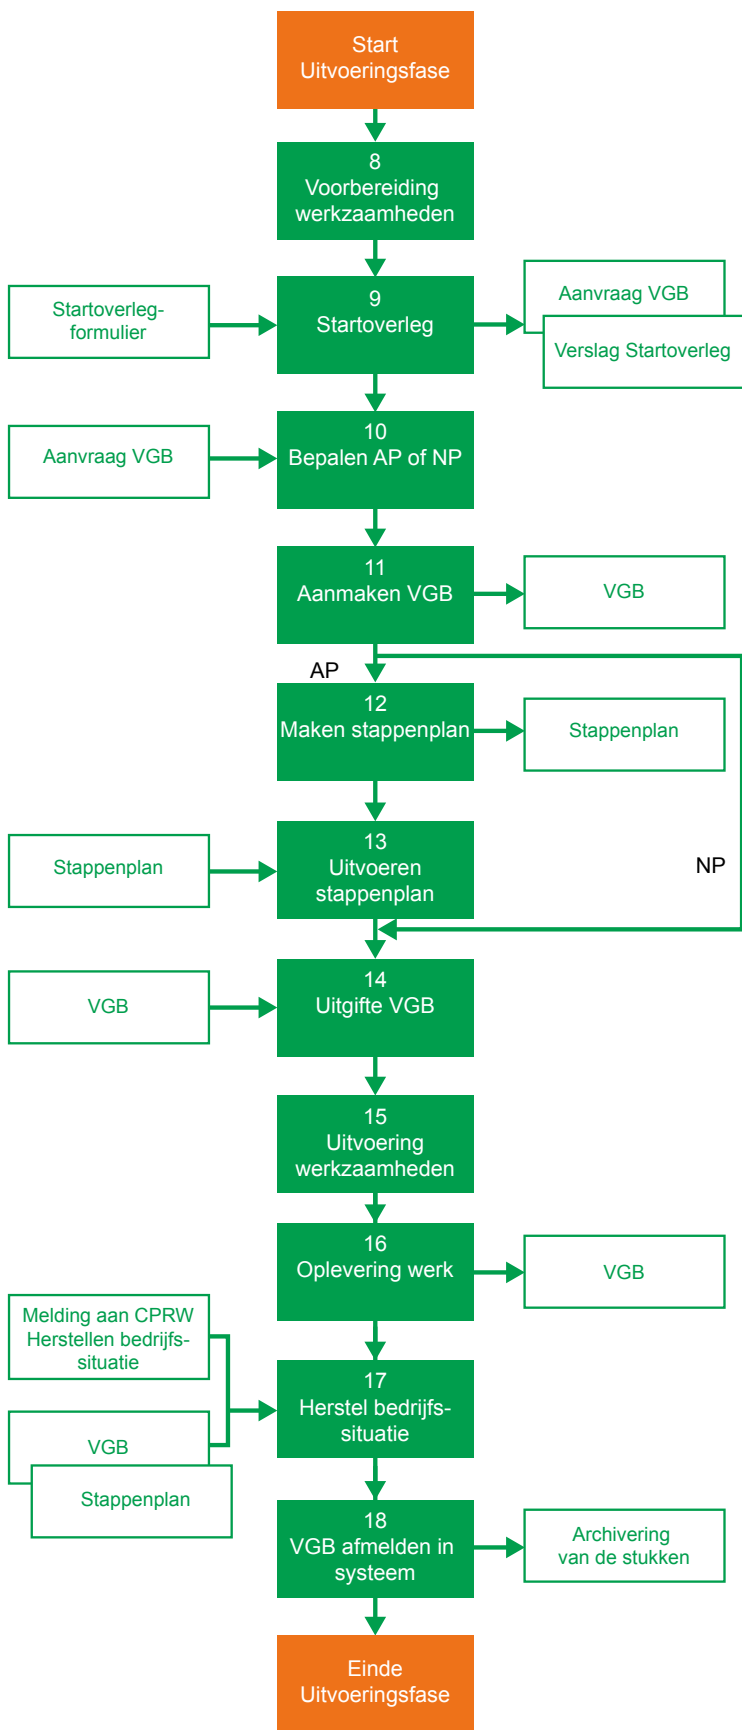

8. Start uitvoeringsfase. Voorbereidingen van het werk door de uitvoerende partij(en). Aanstelling directievoerder door / vanwege opdrachtgever.

9. Voor aanvang van de werkzaamheden vindt het startoverleg plaats. Hierbij zijn de V&G-coördinator uitvoeringsfase, de directievoerder en procesbeheer aanwezig. Tijdens het overleg wordt bekeken of er uitgangspunten uit de ontwerpfase zijn gewijzigd. Als dat zo is, wordt bepaald wat de gevolgen zijn voor de procesvoering van Watermanagement (WM) en welke aanpassingen nodig zijn. Wijzigingen, gevolgen en aanpassingen worden op het startoverleg-formulier vastgesteld. De directievoerende partij zorgt voor verslaglegging. De V&G coördinator uitvoeringsfase dient via de directievoerder een aanvraag bij procesbeheer in voor de verstrekking van een vrijgevingsbewijs (VGB). Werkzaamheden in of aan rioleren, persleidingen of gemalen in beheer bij de afdeling Water, mogen niet gestart worden zonder het VGB. Het VGB geeft de periode aan waarbinnen door de uitvoerende partij aan het systeem of object gewerkt mag worden.

10. Na ontvangst van de aanvraag voor de verstrekking van een VGB gaat procesbeheer na of het om een AP of NP situatie gaat.

11. Er wordt gestart met het aanmaken van een VGB.

12. In geval van een AP maakt Procesbeheer een VGB en een stappenplan aan. In geval van een NP wordt stap 13 overgeslagen en naar stap 14 overgegaan.

13. In het stappenplan zijn in chronologische volgorde de door de afdeling uitvoering voor, tijdens en na de werkzaamheden uit te voeren handelingen vastgelegd. Procesbeheer bepaalt of het stappenplan conflicteert met de op dat moment geldende procesvoering en andere uitgegeven VGB'en. Het stappenplan moet aantoonbaar geverifieerd zijn door de betrokken procesbeheerder van de Centrale Proces en Regelkamer Water (CPRW) en is voor intern gebruik door de afdeling Water.

14. Na aanmaak van het VGB, verschijnt deze op het intranet / Geografische Informatie Systeem (GIS-web). Het VGB wordt via de directievoerder aan de uitvoerende partij verstrekt. De uitvoerende partij kan de werkzaamheden starten binnen de geldigheidsduur van het VGB. Bij dreigende overschrijding van de geldigheidsduur van het VGB moet de uitvoerende partij (zowel in- als extern) via de directievoerder een nieuw VGB bij procesbeheer aanvragen. Procesbeheer doorloopt vervolgens een verkorte procedure (vanaf stap 7).

15. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ziet Procesbeheer toe op de handhaving van de ingestelde bedrijfssituatie. De uitvoerende partij heeft altijd het recht om (eventuele) wijzigingen in het werk volgens het stappenplan te controleren.

16. Bij het beëindigen van de werkzaamheden (inclusief een eventuele beproeving van het object op de juiste werking en de acceptatie van het werk door de directievoerder) levert de uitvoerende partij het door alle partijen ondertekende VGB via de directievoerder in bij procesbeheer.

17. Na ontvangst van het VGB laat procesbeheer de oorspronkelijke bedrijfssituatie herstellen, al dan niet door het stappenplan. Uitvoering meldt de beëindiging van deze herstelactiviteiten aan procesbeheer.

18. Het VGB wordt door procesbeheer afgemeld in het systeem. Procesbeheer archiveert alle bijbehorende stukken. Einde uitvoeringsfase.

Legenda lijst met verklaring afkortingen

AP	Afwijkende procesvoering
CRMK	Centrale Regie en Meldkamer Water
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GIS-web	Het GIS gedeelte op het intranet van de gemeente Rotterdam
IGR	Ingenieursbureau Rotterdam
NP	Normale procesvoering
PvE	Programma van Eisen
RSPW	Rotterdamse standaard voor projectmatig werken
SPvE	Specifiek Programma van Eisen
V&G	Veiligheid en Gezondheid
VGB	Vrijgevingsbewijs
